




ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Settembre 2023												Ottobre :		
				18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02
1	Lavori a MISURA	83 g	488'738,06															
2	Campo Calcio	83 g	488'738,06															
3	Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate della ... calcio, compresa la demolizione e smaltime...	1 g	492,96															
4	Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate delle panchine esistenti	2 g	663,36															
5	Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate delle ... compresa la demolizione e smaltimento ...	1 g	196,84															
6	Scotico e sagomatura del piano esistente eseguito con mez ... ato sino a completo assestamento. Spess...	8 g	13'406,40															
7	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	3 g	1'188,10															
8	Fornitura e posa in opera di geodreno solo zone ampliemen ... di rendere omogenea la resistenza...	9 g	16'395,74															
9	Formazione dei drenaggi secondari superficiali mediante f ... o altro necessario per dare l'opera finit...	10 g	15'418,73															
10	Formazione della rete di scolo delle acque meteoriche, po ... eso collegamento al nuovo pozzetto di racco...	5 g	11'538,80															
11	Formazione di pozzetti di ispezione al collettore drenant ... altro necessario per dare l'opera finita a reg...	5 g	4'256,64															
12	Fornitura e posa in opera di canali in CLS sez. 15,5 x 16 ... il rinfiacco in CLS e il collegamento alla rete fognaria.	9 g	16'441,88															
13	Formazione di nuovo pozzetto di ispezione in CLS delle di ... 'altro necessario per dare l'opera finita a reg...	1 g	951,68															
14	Formazione di impianto d'irrigazione ad 8 irrigatori per ... 6bar Ogni onere compreso allaccio alla ciste...	9 g	18'194,40															
15	Formazione della massicciata di sottofondo, eseguita medi ... re vibranti di peso adeguato sino a compl...	5 g	34'179,26															
16	Livellazione del piano di posa eseguita mediante furnitur ... re vibranti di peso adeguato sino a compl...	12 g	10'888,19															
17	Finitura del piano di posa su tutta la superficie del cam ... cia, compatta ed idonea alla posa del tapp...	12 g	15'758,40															
18	Fornitura di manto in erba artificiale dotato di regolare ... ento e lo smaltimento dei materiali di risulta della posa.	18 g	301'761,60															
19	Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica, alt ... ullatura e livellamento secondo le livellette...	3 g	16'630,00															
20	Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/rise ... e seggiole in PVC. Compresa la bulloneria...	4 g	7'141,22															
21	Fornitura e posa in opera di coppia porte calcio regolame ... ione interna come da regolamento L.N.D....	2 g	2'701,02															
22	Fornitura di pali calcio angolo Ø mm 30, antinfortunic ... onere necessario per dare l'opera finita a reg...	2 g	532,84															

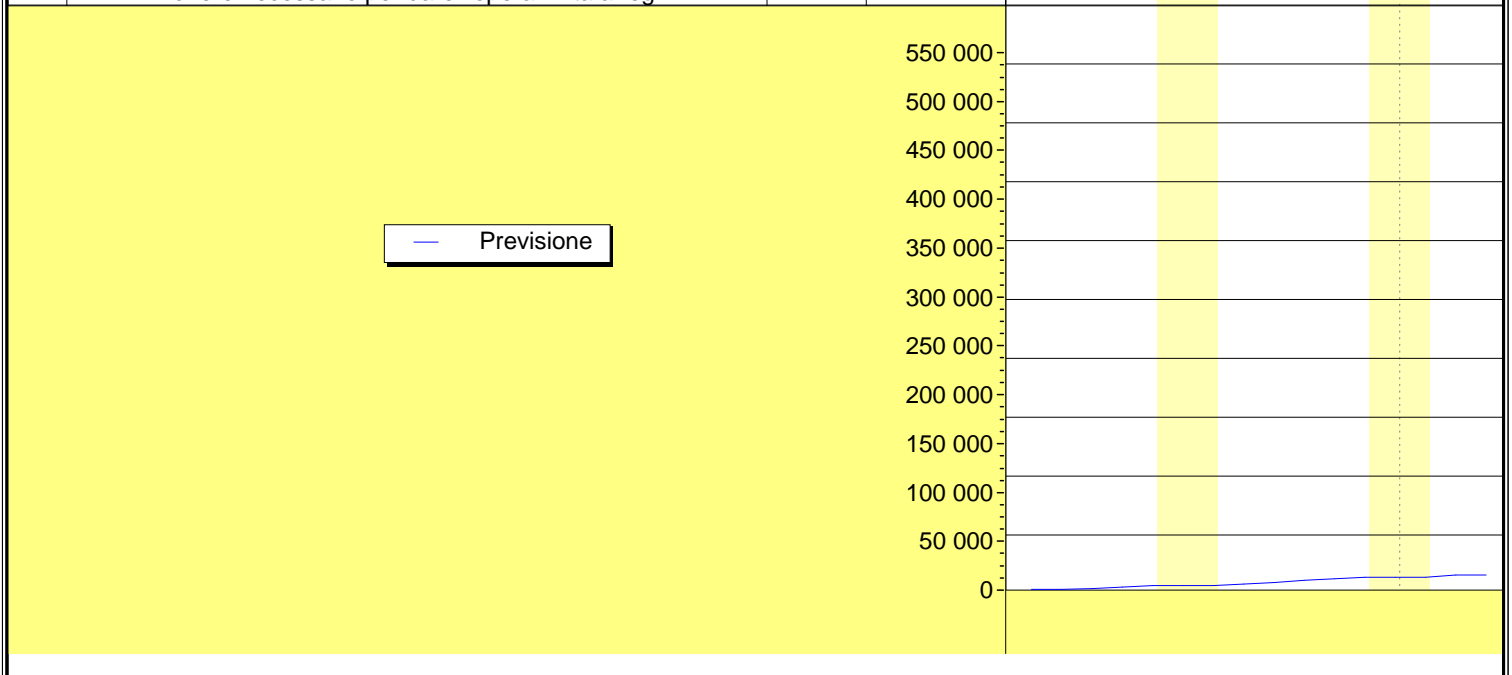


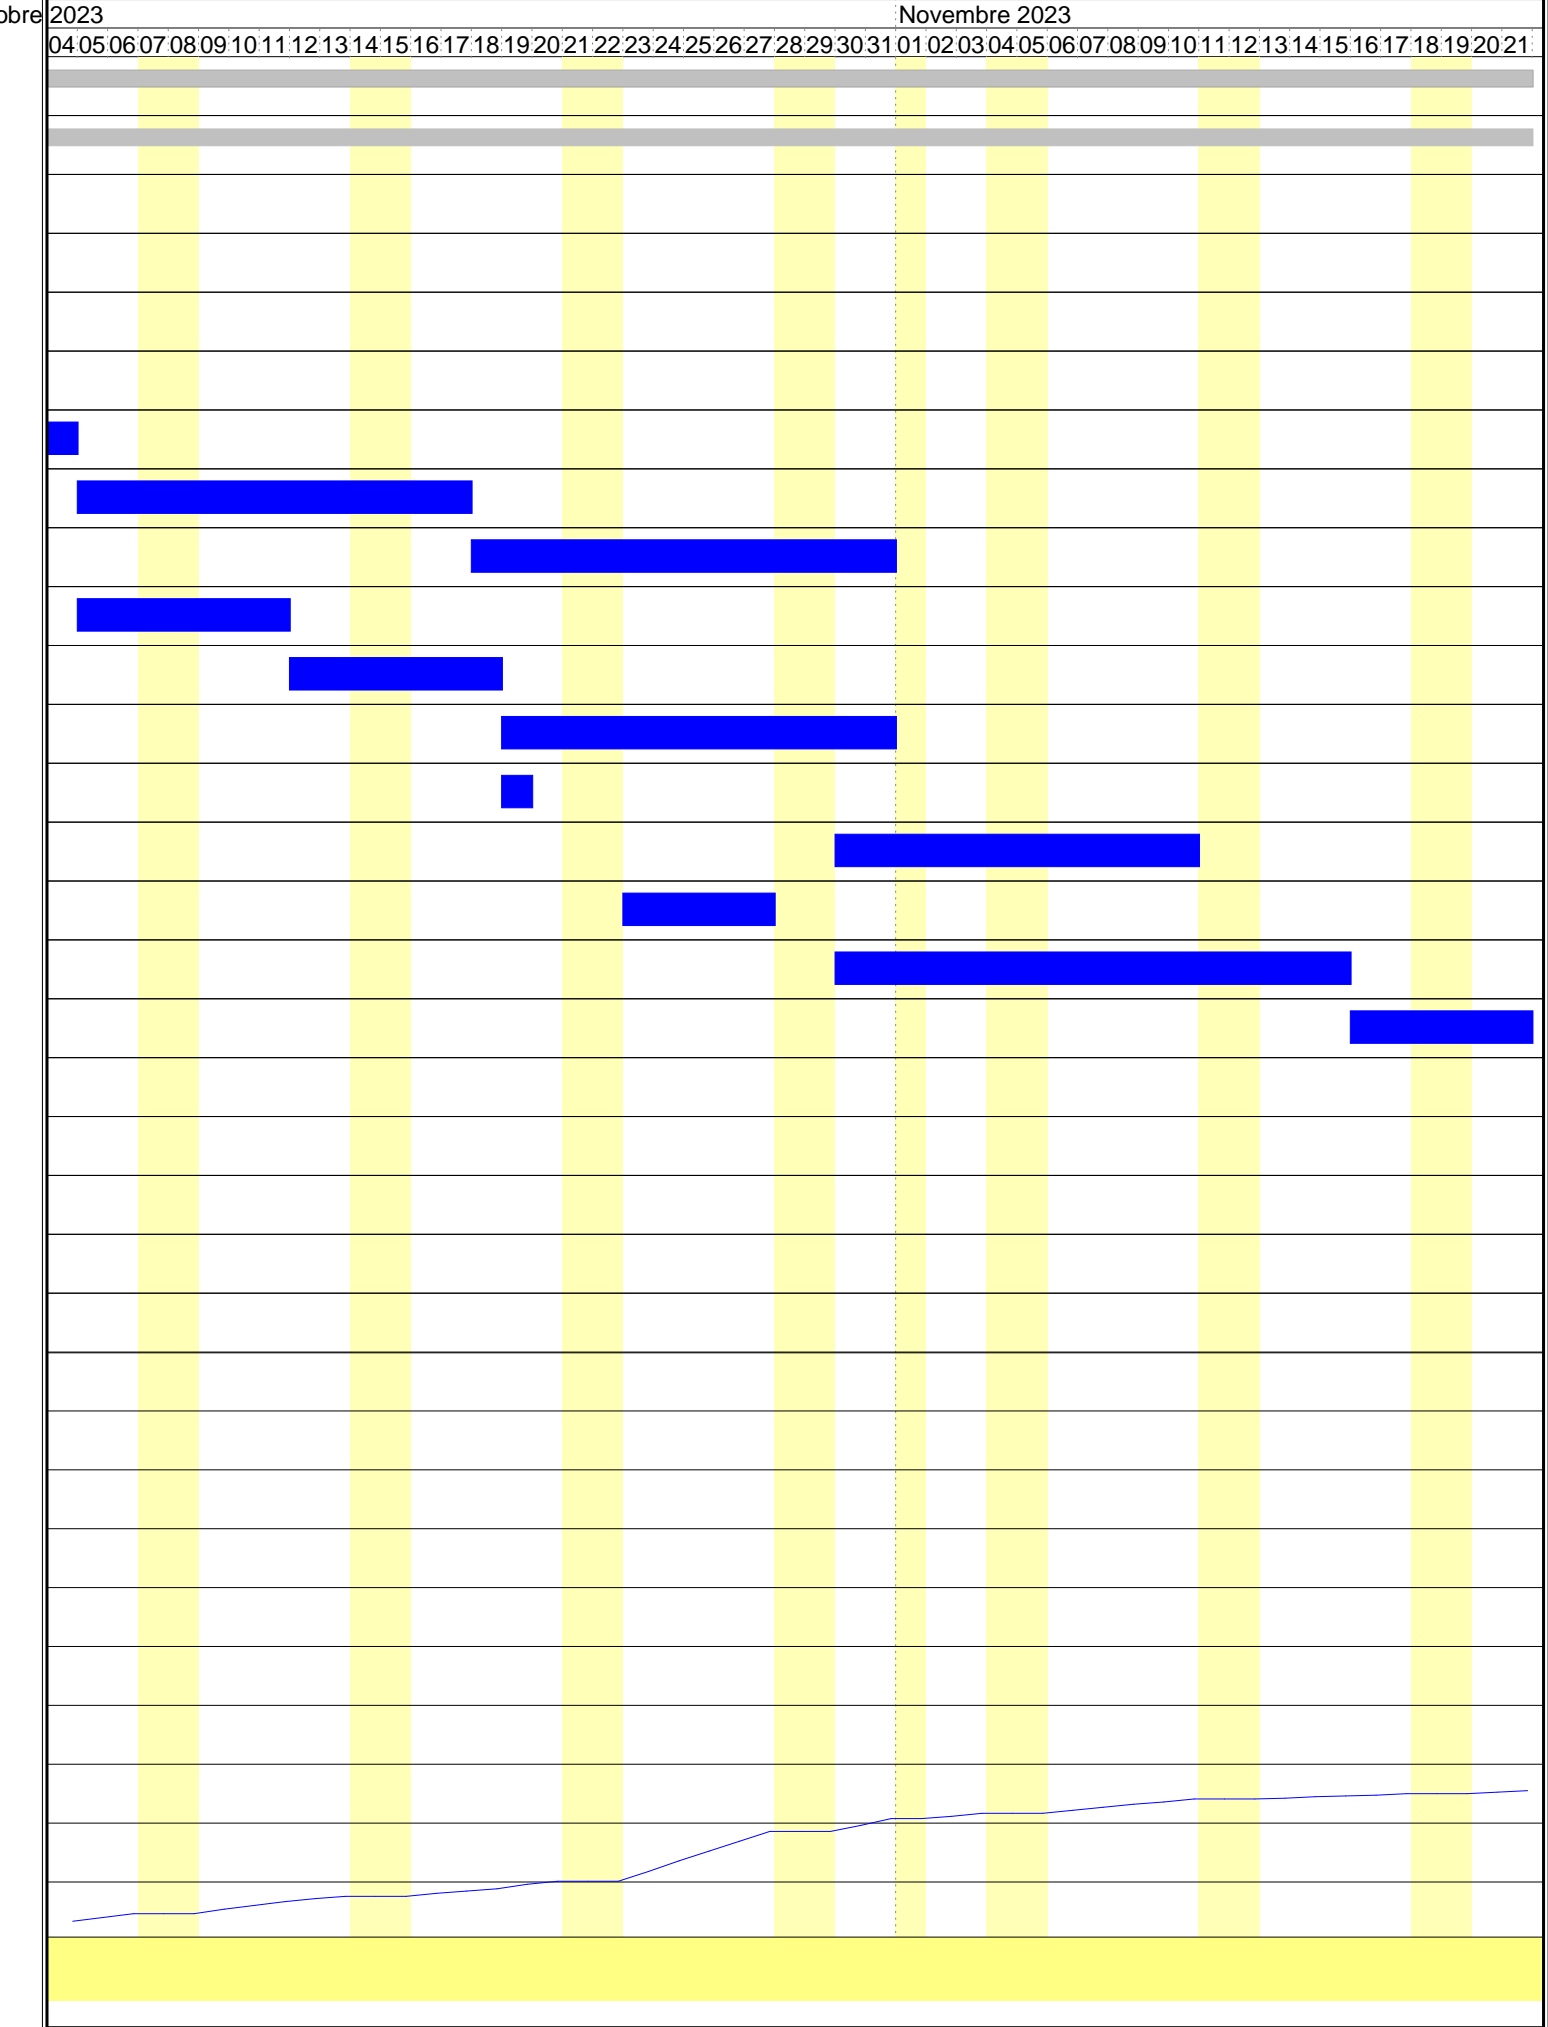

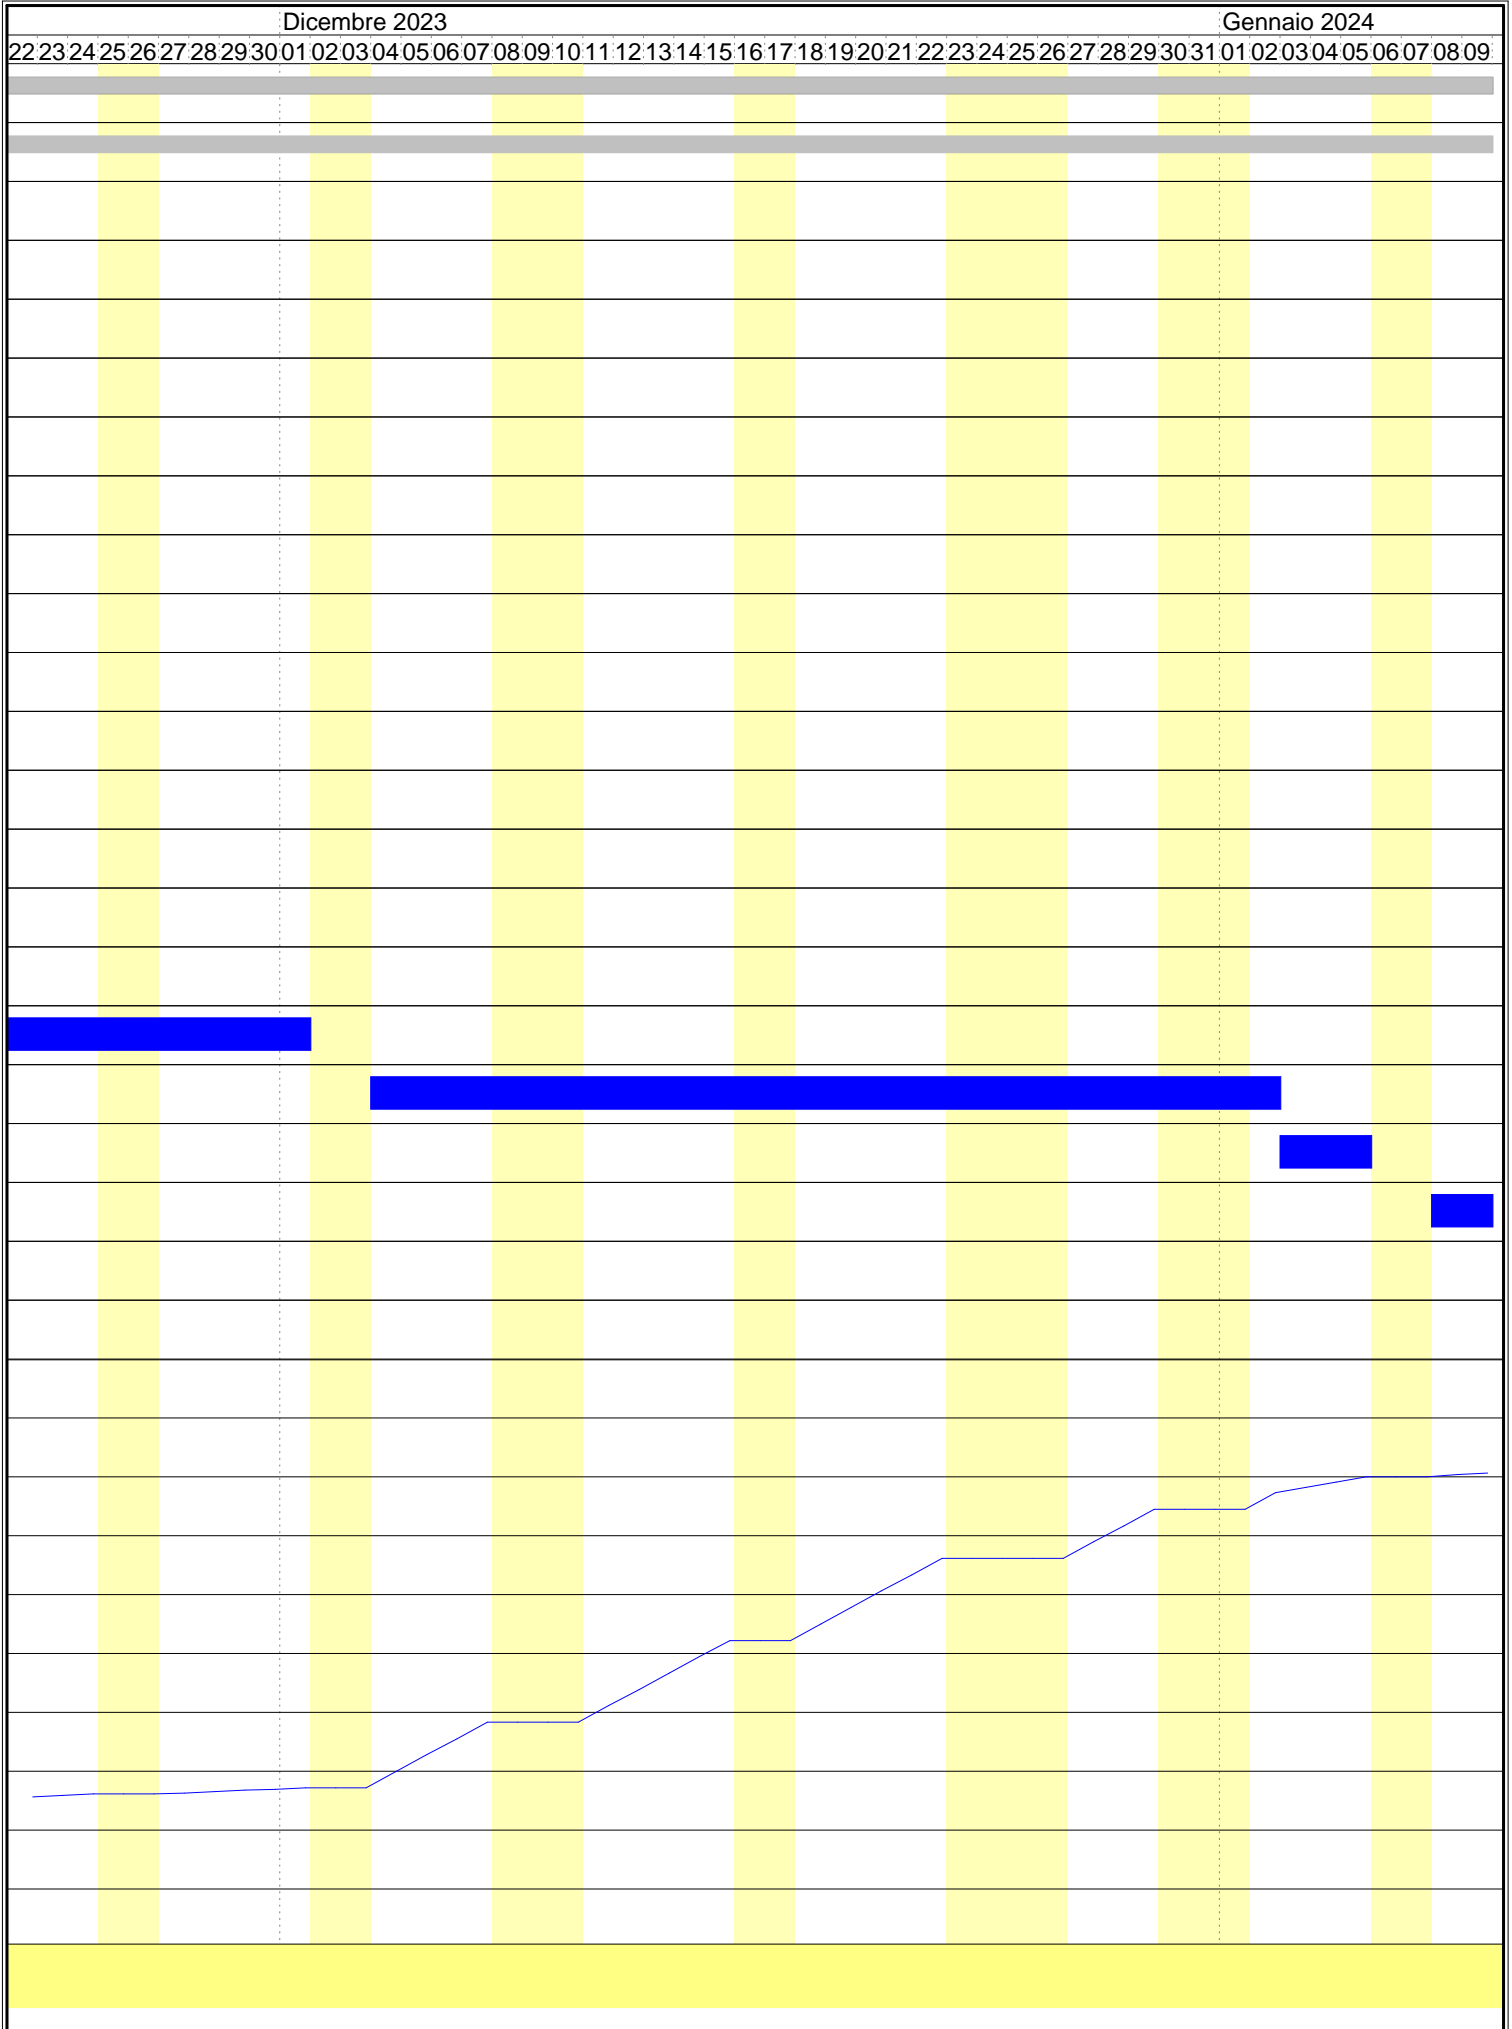

Febbraio 2024

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

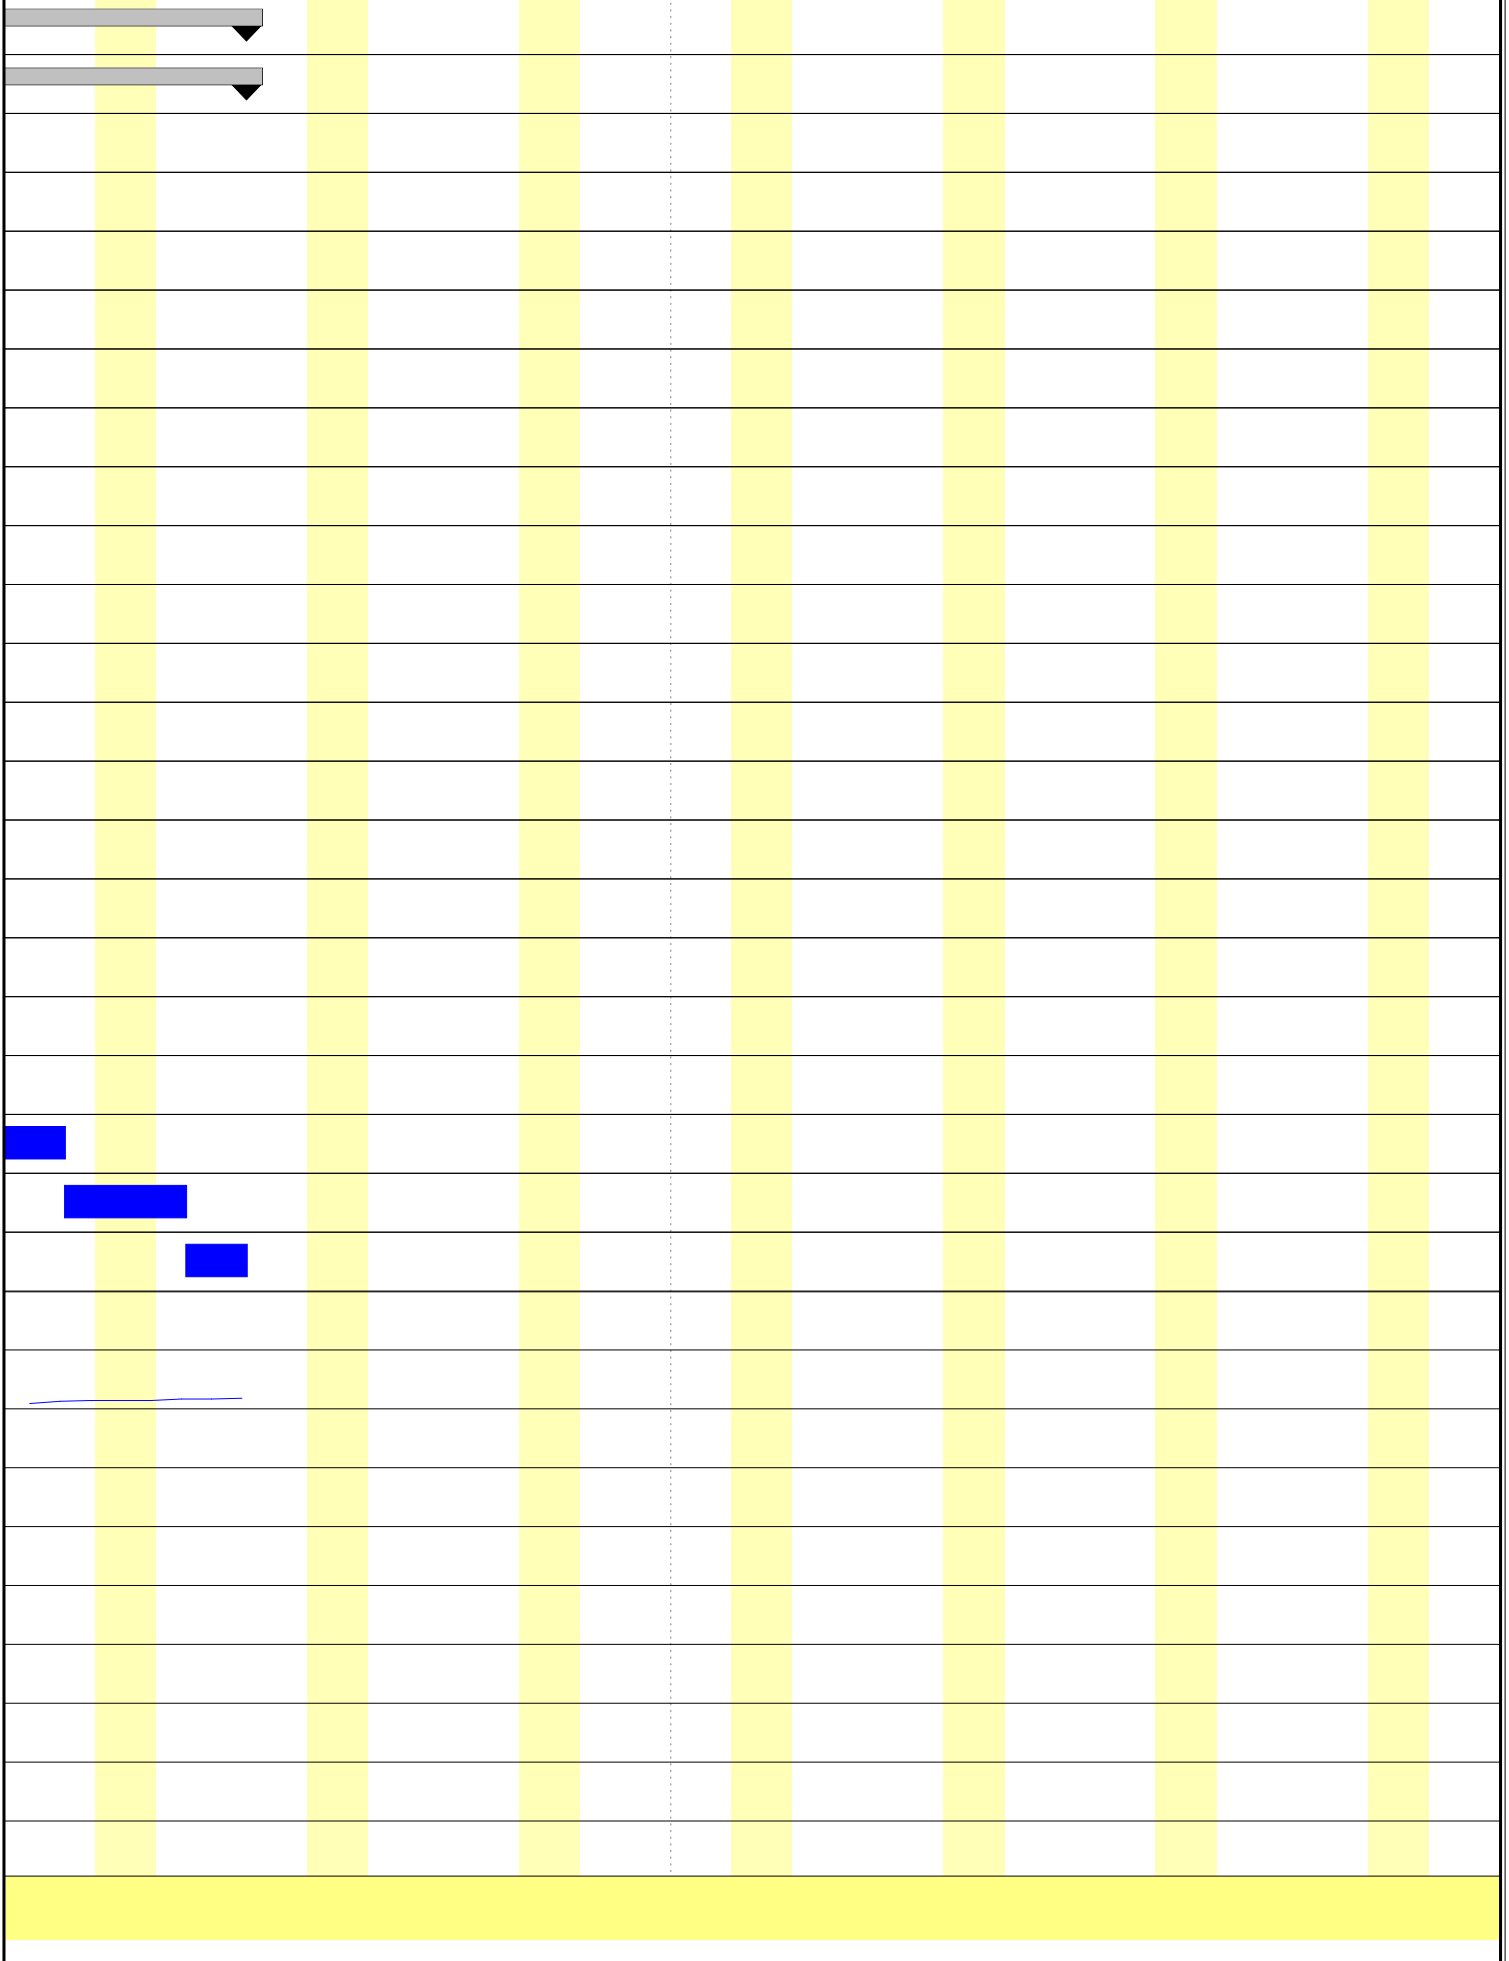

Comune di Meldola

Provincia di Forlì-Cesena

Tabella Attività

OGGETTO: Progetto Definitivo/Esecutivo per realizzazione di Campo Calcio in erba artificiale come da regolamento F.I.G.C. - L.N.D. omologato STANDARD - Stadio Tonino Pantieri, v. IV Novembre

COMMITTENTE: Comune di Meldola

, 23/08/2023

Il Tecnico
(Arch. Massimiliano di Federico)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	488'738,06	100,000	18/09/2023	17/01/2024	83	122
* Campo Calcio	488'738,06	100,000	18/09/2023	17/01/2024	83	122
* * Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate della ... calcio, compresa la demolizione e smaltimento dei plinti.	492,96	0,101	18/09/2023	18/09/2023	1	1
* * Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate delle panchine esistenti	663,36	0,136	19/09/2023	20/09/2023	2	2
* * Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate delle ... compresa la demolizione e smaltimento dei relativi plinti.	196,84	0,040	18/09/2023	18/09/2023	1	1
* * Scotico e sagomatura del piano esistente eseguito con mez ... ato sino a completo assestamento. Spessore medio cm 15÷20.	13'406,40	2,743	21/09/2023	02/10/2023	8	12
* * Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	1'188,10	0,243	02/10/2023	04/10/2023	3	3
* * Fornitura e posa in opera di geodreno solo zone ampliamen ... di rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione.	16'395,74	3,355	05/10/2023	17/10/2023	9	13
* * Formazione dei drenaggi secondari superficiali mediante f ... o altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte	15'418,73	3,155	18/10/2023	31/10/2023	10	14
* * Formazione della rete di scolo delle acque meteoriche, po ... eso collegamento al nuovo pozzetto di raccolta diaframmato	11'538,80	2,361	05/10/2023	11/10/2023	5	7
* * Formazione di pozzetti di ispezione al collettore drenant ... altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	4'256,64	0,871	12/10/2023	18/10/2023	5	7
* * Fornitura e posa in opera di canali in CLS sez. 15,5 x 16 ... il rinfiacco in CLS e il collegamento alla rete fognaria.	16'441,88	3,364	19/10/2023	31/10/2023	9	13
* * Formazione di nuovo pozzetto di ispezione in CLS delle di ... 'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	951,68	0,195	19/10/2023	19/10/2023	1	1
* * Formazione di impianto d'irrigazione ad 8 irrigatori per ... 6bar Ogni onere compreso allaccio alla cisterna esistente	18'194,40	3,723	30/10/2023	10/11/2023	9	12
* * Formazione della massicciata di sottofondo, eseguita medi ... re vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento.	34'179,26	6,993	23/10/2023	27/10/2023	5	5
* * Livellazione del piano di posa eseguita mediante fornitur ... re vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento.	10'888,19	2,228	30/10/2023	15/11/2023	12	17
* * Finitura del piano di posa su tutta la superficie del cam ... cia, compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale.	15'758,40	3,224	16/11/2023	01/12/2023	12	16
* * Fornitura di manto in erba artificiale dotato di regolare ... ento e lo smaltimento dei materiali di risulta della posa.	301'761,60	61,743	04/12/2023	02/01/2024	18	30
* * Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica, alt ... ullatura e livellamento secondo le livellette di progetto.	16'630,00	3,403	03/01/2024	05/01/2024	3	3
* * Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/rise ... e seggiole in PVC. Compresa la bulloneria di assemblaggio.	7'141,22	1,461	08/01/2024	11/01/2024	4	4
* * Fornitura e posa in opera di coppia porte calcio regolame ... ione interna come da regolamento L.N.D. di ml 7,32 x 2,44:	2'701,02	0,553	12/01/2024	15/01/2024	2	4
* * Fornitura di pali calcio angolo Ø mm 30, antinfortunic ... onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	532,84	0,109	16/01/2024	17/01/2024	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Data, 23/08/2023 Tecnico Arch. Massimiliano di Federico						

Comune di Meldola

Provincia di Forlì-Cesena

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Progetto Definitivo/Esecutivo per realizzazione di Campo Calcio in erba artificiale come da regolamento F.I.G.C. - L.N.D. omologato STANDARD - Stadio Tonino Pantieri, v. IV Novembre

COMMITTENTE: Comune di Meldola

, 23/08/2023

Il Tecnico
(Arch. Massimiliano di Federico)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
18/09/2023	689,80	689,80	0,141
19/09/2023	331,68	1'021,48	0,209
20/09/2023	331,68	1'353,16	0,277
21/09/2023	1'675,80	3'028,96	0,620
22/09/2023	1'675,80	4'704,76	0,963
25/09/2023	1'675,80	6'380,56	1,306
26/09/2023	1'675,80	8'056,36	1,648
27/09/2023	1'675,80	9'732,16	1,991
28/09/2023	1'675,80	11'407,96	2,334
29/09/2023	1'675,80	13'083,76	2,677
02/10/2023	2'071,83	15'155,59	3,101
03/10/2023	396,03	15'551,62	3,182
04/10/2023	396,03	15'947,65	3,263
05/10/2023	4'129,51	20'077,16	4,108
06/10/2023	4'129,51	24'206,67	4,953
09/10/2023	4'129,51	28'336,18	5,798
10/10/2023	4'129,51	32'465,69	6,643
11/10/2023	4'129,51	36'595,20	7,488
12/10/2023	2'673,08	39'268,27	8,035
13/10/2023	2'673,08	41'941,35	8,582
16/10/2023	2'673,08	44'614,43	9,128
17/10/2023	2'673,08	47'287,50	9,675
18/10/2023	2'393,20	49'680,71	10,165
19/10/2023	4'320,43	54'001,13	11,049
20/10/2023	3'368,75	57'369,88	11,738
23/10/2023	10'204,60	67'574,48	13,826
24/10/2023	10'204,60	77'779,09	15,914
25/10/2023	10'204,60	87'983,69	18,002
26/10/2023	10'204,60	98'188,29	20,090
27/10/2023	10'204,60	108'392,89	22,178
30/10/2023	6'297,70	114'690,58	23,467
31/10/2023	6'297,70	120'988,28	24,755
02/11/2023	2'928,95	123'917,23	25,355
03/11/2023	2'928,95	126'846,18	25,954
06/11/2023	2'928,95	129'775,13	26,553
07/11/2023	2'928,95	132'704,08	27,152
08/11/2023	2'928,95	135'633,03	27,752
09/11/2023	2'928,95	138'561,98	28,351
10/11/2023	2'928,95	141'490,93	28,950
13/11/2023	907,35	142'398,28	29,136
14/11/2023	907,35	143'305,63	29,322
15/11/2023	907,35	144'212,98	29,507
16/11/2023	1'313,20	145'526,18	29,776
17/11/2023	1'313,20	146'839,38	30,045
20/11/2023	1'313,20	148'152,58	30,313
21/11/2023	1'313,20	149'465,78	30,582
22/11/2023	1'313,20	150'778,98	30,851
23/11/2023	1'313,20	152'092,18	31,119
24/11/2023	1'313,20	153'405,38	31,388
27/11/2023	1'313,20	154'718,58	31,657
28/11/2023	1'313,20	156'031,78	31,925
29/11/2023	1'313,20	157'344,98	32,194
30/11/2023	1'313,20	158'658,18	32,463
01/12/2023	1'313,20	159'971,38	32,732
04/12/2023	16'764,53	176'735,91	36,162
05/12/2023	16'764,53	193'500,44	39,592
06/12/2023	16'764,53	210'264,98	43,022
07/12/2023	16'764,53	227'029,51	46,452
11/12/2023	16'764,53	243'794,04	49,882
12/12/2023	16'764,53	260'558,58	53,313
13/12/2023	16'764,53	277'323,11	56,743
14/12/2023	16'764,53	294'087,64	60,173
15/12/2023	16'764,53	310'852,18	63,603

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
18/12/2023	16'764,53	327'616,71	67,033
19/12/2023	16'764,53	344'381,24	70,463
20/12/2023	16'764,53	361'145,78	73,894
21/12/2023	16'764,53	377'910,31	77,324
22/12/2023	16'764,53	394'674,84	80,754
27/12/2023	16'764,53	411'439,38	84,184
28/12/2023	16'764,53	428'203,91	87,614
29/12/2023	16'764,53	444'968,44	91,044
02/01/2024	16'764,53	461'732,97	94,475
03/01/2024	5'543,33	467'276,31	95,609
04/01/2024	5'543,33	472'819,64	96,743
05/01/2024	5'543,33	478'362,97	97,877
08/01/2024	1'785,31	480'148,28	98,242
09/01/2024	1'785,31	481'933,58	98,608
10/01/2024	1'785,31	483'718,89	98,973
11/01/2024	1'785,31	485'504,20	99,338
12/01/2024	1'350,51	486'854,71	99,615
15/01/2024	1'350,51	488'205,22	99,891
16/01/2024	266,42	488'471,64	99,945
17/01/2024	266,42	488'738,06	100,000
Data, 23/08/2023			
Tecnico Arch. Massimiliano di Federico			
